

CONSULTAS

01 Ver ubicación de pararrayos, descargas atmosféricas si es la que están solicitando ahora.

La ubicación del pararrayo es el solicitado.

Se puede realizar una sola pata de ganso y ese dinero quedaría a favor.

Saludos

Mtra. Téc. Raquel Moreira


Asesor Instalaciones Eléctricas - PAEPU

02 Aclarar la conexión a colector ya que el plano de sanitario S01 de la ampliación tiene dibujado a construir la cámara 1 pero la escuela existente ya tiene conexión a colector


Respuesta:

- En la cámara de inspección de conexión al saneamiento, nunca se pudo observar el sifón limpio, siempre se observó obstruido, yéndose el agua por el desconector del sifón que no tiene la tapa de inspección. Puede estar pasando que el sifón este roto.
- Para cambiar el sifón hay que realizar una obra compleja, hay que reconstruir la C.I. N° 1 a cero, acceder por la vereda por la calle Av. Millán es complejo, porque existen redes UTE, GAS y OSE. (se desconoce si de ANTEL) en una vereda angosta.
- El saneamiento público de la IM pasa por la vereda.
- En 13/03/2023 se solicitó destapar a la IM. Indicando la IM que existe un problema interno. (puede ser sifón)

Medidas de Cámara de Conexión Existente.

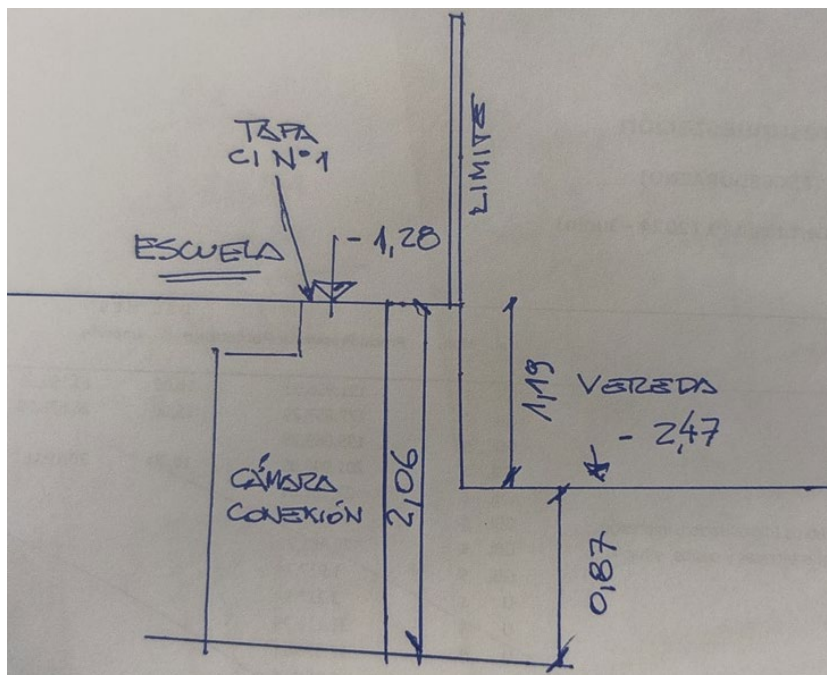

Redes de colectores Unitarios.

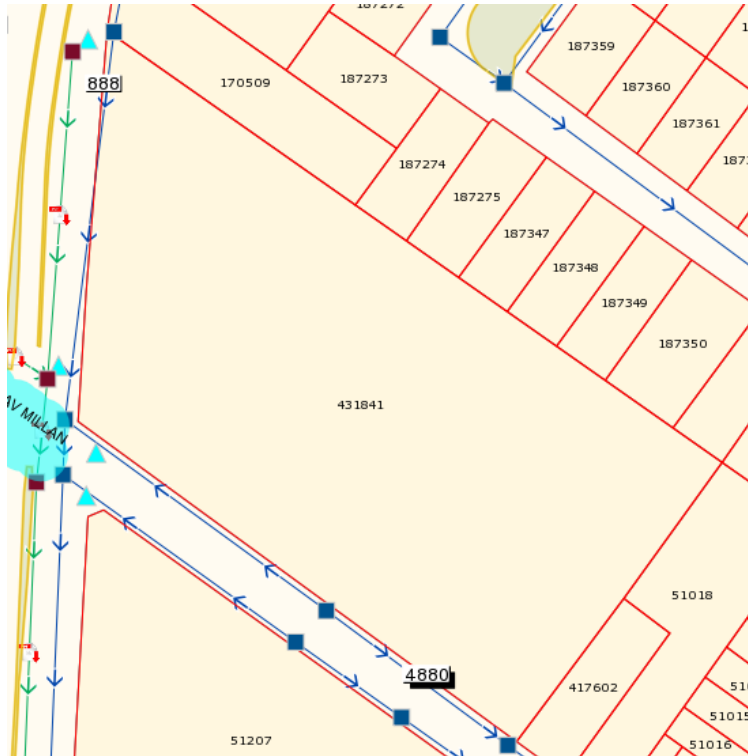

Solicitud de IM – día 13/03/2023

Consulta de solicitudes de servicio

Número de servicio

27175023

Etapas 3 de 3:

Cerrada ?

SOLICITUD INGRESADA

Fecha: 13/03/2023

Descripción: conexion obstruida. la conexion esta por av millan.

Área: Saneamiento

Categoría: Conexion Obstruida

Dirección: AV GRAL EUGENIO GARZON N°: 888 [Padron: 431841] entre AV MILLAN y CNO ARIEL

Especificación:

Municipio: G

CCZ: 13

TAREAS REALIZADAS

Área: Saneamiento

Tipo: Desobstruccion de Conexion

Fecha: 13/03/2023 14:30

Resultado: Terminado

Informe:

Lopez, Chichet, Ocaño, Pioli.-

se destapo sifon. problema interno.-

Ubicación de conexión existente.




Horacio Firpo
Asesor Instalaciones Sanitarias

03 Instalación de GAS Natural.

Instalación de gas natural

- La instalación exterior se debe ajustar a las instalaciones provisionales de aulas, ss.hh. y cocina.
- En caso de no poder hacer el ajuste, la instalación de gas subterránea se debe ejecutar posterior al retiro de las aulas prefabricadas. Con el edificio nuevo en ejecución.
 - o Se usara de manera provisoria sistema de GLP con garrafas dentro del local.
 - o Posterior a la habilitación de GN, se conectara y convertirá aparatos de cocción.
- Aclaración 1, la conexión de GN ya está abonada por la ANEP, la coordinación de tramites las realiza ANEP - PAEPU por medio de apoderada y T.S. Horacio Firpo.
- Aclaración 2, la instalación se realizó de acuerdo a las redes existentes en el año 2022, por la calle Av. Millán existieron obras de infraestructura vial y se realizaron redes. En caso de existir redes en la vereda de la Escuela por calle Av. Millan, El proyecto se puede ajustar.

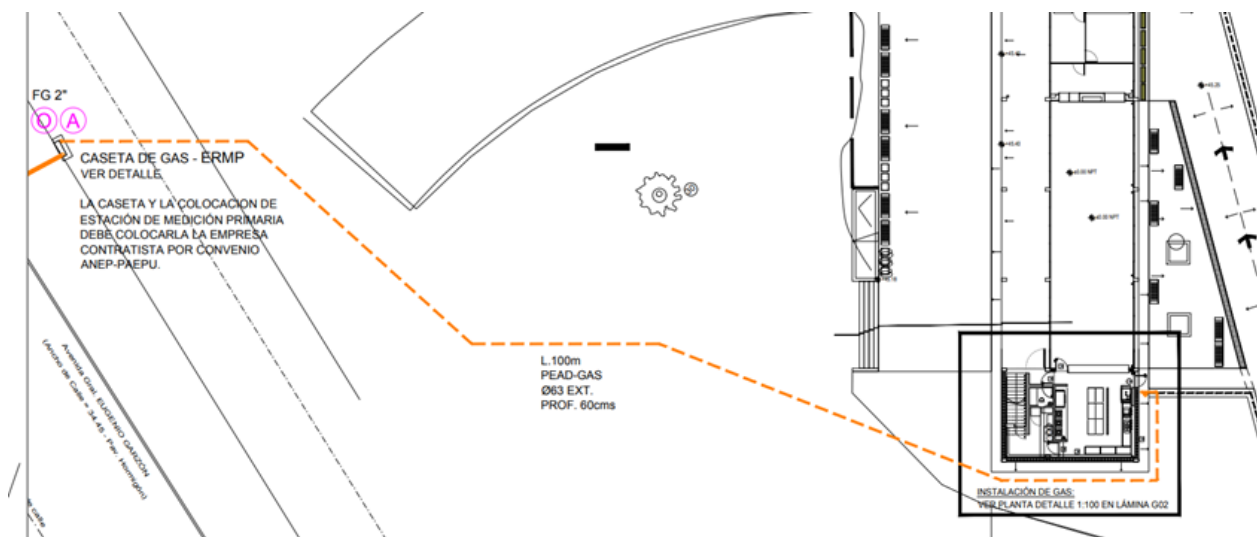

Horacio Firpo
Asesor Instalaciones Sanitarias
