		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1		**Obras Edificio CND 2024**	**70 days?**	**1/10/24 8:00**	**9/12/24 17:00**
2		**Piso 5**	**69 days**	**1/10/24 8:00**	**8/12/24 17:00**
3		**#1 - SSHH + Kitchenette**	**26 days**	**1/10/24 8:00**	**26/10/24 17:00**
4		Retiro de mobiliario a recolocar	1 day	1/10/24 8:00	1/10/24 17:00
5		Demoliciones	2 days	2/10/24 8:00	3/10/24 17:00
6		Instalación sanitaria	2 days	4/10/24 8:00	5/10/24 17:00
7		Instalación eléctrica	2 days	6/10/24 8:00	7/10/24 17:00
8		Impermeabilizaciones	2 days	8/10/24 8:00	9/10/24 17:00
9		Pruebas y Ensayos	2 days	10/10/24 8:00	11/10/24 17:00
10		Revoques	3 days	12/10/24 8:00	14/10/24 17:00
11		Contrapisos	2 days	15/10/24 8:00	16/10/24 17:00
12		Revestimientos	5 days	17/10/24 8:00	21/10/24 17:00
13		Terminaciones (todas)	3 days	22/10/24 8:00	24/10/24 17:00
14		Reinstalación de mobiliario	2 days	25/10/24 8:00	26/10/24 17:00
15		**#2 y #3**	**33 days**	**4/10/24 8:00**	**5/11/24 17:00**
16		Demoliciones	4 days	4/10/24 8:00	7/10/24 17:00
17		Instalación sanitaria	3 days	8/10/24 8:00	10/10/24 17:00
18		Instalación eléctrica	3 days	11/10/24 8:00	13/10/24 17:00
19		Impermeabilizaciones	4 days	14/10/24 8:00	17/10/24 17:00
20		Pruebas y Ensayos	2 days	18/10/24 8:00	19/10/24 17:00
21		Revoques	5 days	20/10/24 8:00	24/10/24 17:00
22		Contrapisos	2 days	25/10/24 8:00	26/10/24 17:00
23		Revestimientos	7 days	27/10/24 8:00	2/11/24 17:00
24		Terminaciones	3 days	3/11/24 8:00	5/11/24 17:00
25		**#4 y #5**	**33 days**	**6/11/24 8:00**	**8/12/24 17:00**
26		Demoliciones	4 days	6/11/24 8:00	9/11/24 17:00
27		Instalación sanitaria	3 days	10/11/24 8:00	12/11/24 17:00
28		Instalación eléctrica	3 days	13/11/24 8:00	15/11/24 17:00
29		Impermeabilizaciones	4 days	16/11/24 8:00	19/11/24 17:00
30		Pruebas y Ensayos	2 days	20/11/24 8:00	21/11/24 17:00
31		Revoques	5 days	22/11/24 8:00	26/11/24 17:00
32		Contrapisos	2 days	27/11/24 8:00	28/11/24 17:00
33		Revestimientos	7 days	29/11/24 8:00	5/12/24 17:00
34		Terminaciones	3 days	6/12/24 8:00	8/12/24 17:00
35		**Piso 3**	**58 days**	**8/10/24 8:00**	**4/12/24 17:00**
36		**#1 + #2 + Kitchenette**	**40 days**	**8/10/24 8:00**	**16/11/24 17:00**
37		Retiro de mobiliario a recolocar	1 day	8/10/24 8:00	8/10/24 17:00
38		Demoliciones (incluye protecciones)	10 days	9/10/24 8:00	18/10/24 17:00
39		Instalación sanitaria	2 days	19/10/24 8:00	20/10/24 17:00
40		Instalación eléctrica	2 days	21/10/24 8:00	22/10/24 17:00
41		Impermeabilizaciones	2 days	23/10/24 8:00	24/10/24 17:00
42		Pruebas y Ensayos	2 days	25/10/24 8:00	26/10/24 17:00
43		Revoques	5 days	27/10/24 8:00	31/10/24 17:00
44		Contrapisos	2 days	1/11/24 8:00	2/11/24 17:00
45		Revestimientos	7 days	3/11/24 8:00	9/11/24 17:00
46		Terminaciones (todas)	3 days	10/11/24 8:00	12/11/24 17:00
47		Reinstalación de mobiliario	2 days	13/11/24 8:00	14/11/24 17:00
48		Suministro e instalación de nuevo mobili...	2 days	15/11/24 8:00	16/11/24 17:00
49		**#4 - Sala Lactancia y SSHH**	**1 day**	**10/11/24 8:00**	**10/11/24 17:00**
50		Instalación de Mobiliario	1 day	10/11/24 8:00	10/11/24 17:00
51		**#5 - SSHH**	**25 days**	**10/11/24 8:00**	**4/12/24 17:00**
52		Demoliciones	3 days	10/11/24 8:00	12/11/24 17:00
53		Instalación sanitaria	2 days	13/11/24 8:00	14/11/24 17:00
54		Instalación eléctrica	2 days	15/11/24 8:00	16/11/24 17:00
55		Impermeabilizaciones	2 days	17/11/24 8:00	18/11/24 17:00
56		Pruebas y Ensayos	2 days	19/11/24 8:00	20/11/24 17:00
57		Revoques	5 days	21/11/24 8:00	25/11/24 17:00
58		Contrapisos	2 days	26/11/24 8:00	27/11/24 17:00
59		Revestimientos	5 days	28/11/24 8:00	2/12/24 17:00
60		Terminaciones	2 days	3/12/24 8:00	4/12/24 17:00
61		**Sub suelo**	**29 days**	**19/10/24 8:00**	**16/11/24 17:00**
62		**#8 adecuación depósito - Ducha**	**29 days**	**19/10/24 8:00**	**16/11/24 17:00**
63		Demoliciones	2 days	19/10/24 8:00	20/10/24 17:00
64		Instalación sanitaria	4 days	21/10/24 8:00	24/10/24 17:00
65		Instalación eléctrica	2 days	25/10/24 8:00	26/10/24 17:00
66		Impermeabilizaciones	3 days	27/10/24 8:00	29/10/24 17:00
67		Pruebas y Ensayos	2 days	30/10/24 8:00	31/10/24 17:00
68		Revoques	5 days	1/11/24 8:00	5/11/24 17:00
69		Cielorraso	2 days	6/11/24 8:00	7/11/24 17:00
70		Contrapisos	2 days	8/11/24 8:00	9/11/24 17:00
71		Revestimientos	5 days	10/11/24 8:00	14/11/24 17:00
72		Terminaciones	2 days	15/11/24 8:00	16/11/24 17:00
73		**Generalidades**	**70 days?**	**1/10/24 8:00**	**9/12/24 17:00**
74		Implantación	2 days	1/10/24 8:00	2/10/24 17:00
75		**Verificaciones iniciales**	**3 days**	**1/10/24 8:00**	**3/10/24 17:00**
81		**Replanteos**	**21 days**	**1/10/24 8:00**	**21/10/24 17:00**
86		**Actividades diarias**	**70 days**	**1/10/24 8:00**	**9/12/24 17:00**

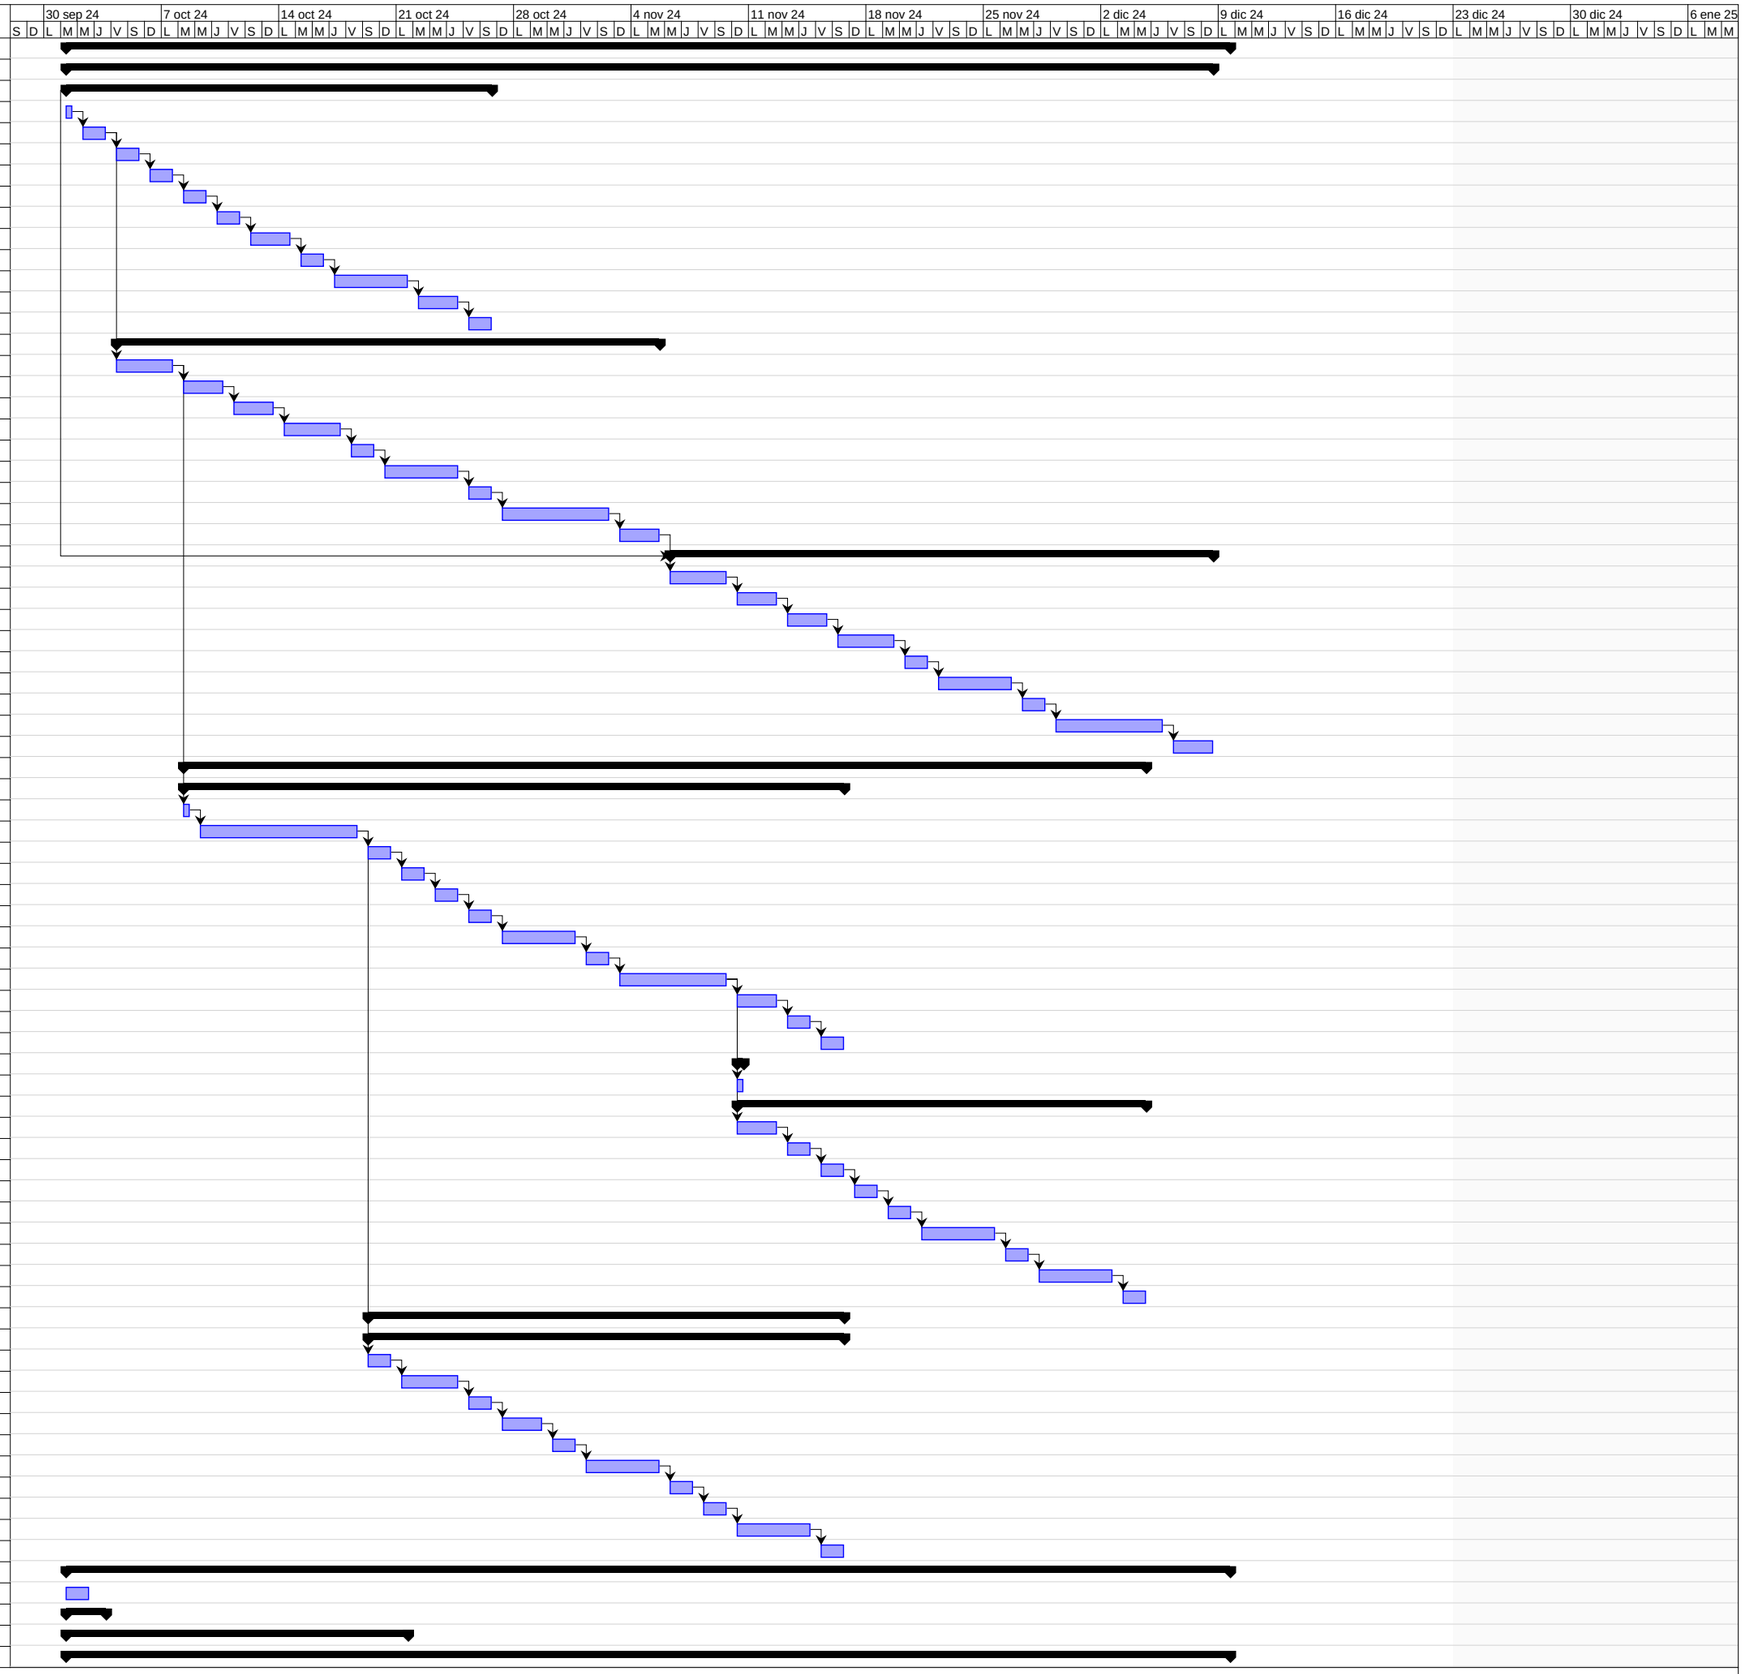

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
90		**Actividades esporádicas**	**70 days?**	**1/10/24 8:00**	**9/12/24 17:00**
